Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260616-37-2026DFCISSB-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

PIDAF DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SUD SAINTE BAUME

FICHE OUVRAGE DFCI

W301

Numéro début de PIDAF	**Pas de numéro**
Numéro Objectif	**W301**
Commune(s)	**La Cadière-d'Azur Le Castellet**
Massif	**Monts Toulonnais**
Maitrise d'ouvrage Débroussaillement	**CASSB**

Objectif Stratégie DFCI	Priorité n°**2**
	2eme catégorie - Piste de Liaison
	glacis

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE	
Longueur de la piste (ml)	**1435**
Surface en débroussaillement	**1,4 Ha**
FONCIER	
Propriété foncière et gestion	30,5 % du linéaire de piste en forêt soumise au régime forestier
Ouverture à la circulation	Fermée
Servitude	Planifié
SYNERGIES A LA DFCI	
Brulage dirigé	Potentiel
Eclaircie	non
Zone Agricole	non
Pastoralisme	Potentiel existant - à encourager
TRAVAUX ANTERIEURS	
Débroussaillement	Pas de débroussaillement récent
Bande de roulement	2013
BANDE DE ROULEMENT	
Etat en début de PIDAF (fin 2024)	**altéré**

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260616-37-2026DFCISSB-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Travaux à prévoir	**Mise en conformité**
Aire de croisement et de retournement	à mettre aux normes lors des travaux
DEBROUSSAILLEMENT	
Surface en débroussaillement (ha)	**1,4**
Description	**2 * 2m**
Type de travaux (ha)	**0 en entretien** **1,4 en création**
Mécanisation	**60 %**


POINTS D'EAU				
Numéro	Nature	Capacité	Terrestre / HBE	Travaux
CAR 4	Citerne fixe	25	non HBE	

EQUIPEMENTS	
BO complet et panneaux directionnels	A Ajouter : 3 BO et 2 directionnels sur la piste + 2 panneau directionnels aux jourdans
Barrière	pas de barrières actuellement, à prévoir

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260616-37-2026DFCISSB-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Zonage naturel	Non concerné
Enjeux patrimoniaux	Non concerné
Habitats naturels d'intérêt concernés	Pas d'habitat d'intérêt - guarrigues
Espèces patrimoniales et/ou protégées dans emprise des travaux de débroussaillement (SILENE)	Absence dans la base SILENE d'espèces protégées
Mesure d'évitement des impacts environnementaux	**ME_3 ME_4 ME_6**
Mesure de réduction des impacts environnementaux	**MR_1 MR_2 MR_3 MR_5 MR_6 MR_7 MR_8 MR_9**
Période d'intervention	**Aucune contrainte en dehors de la prise en compte des restrictions liées à la période à risque feu de foret**

Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20260616-37-2026DFCISSB-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

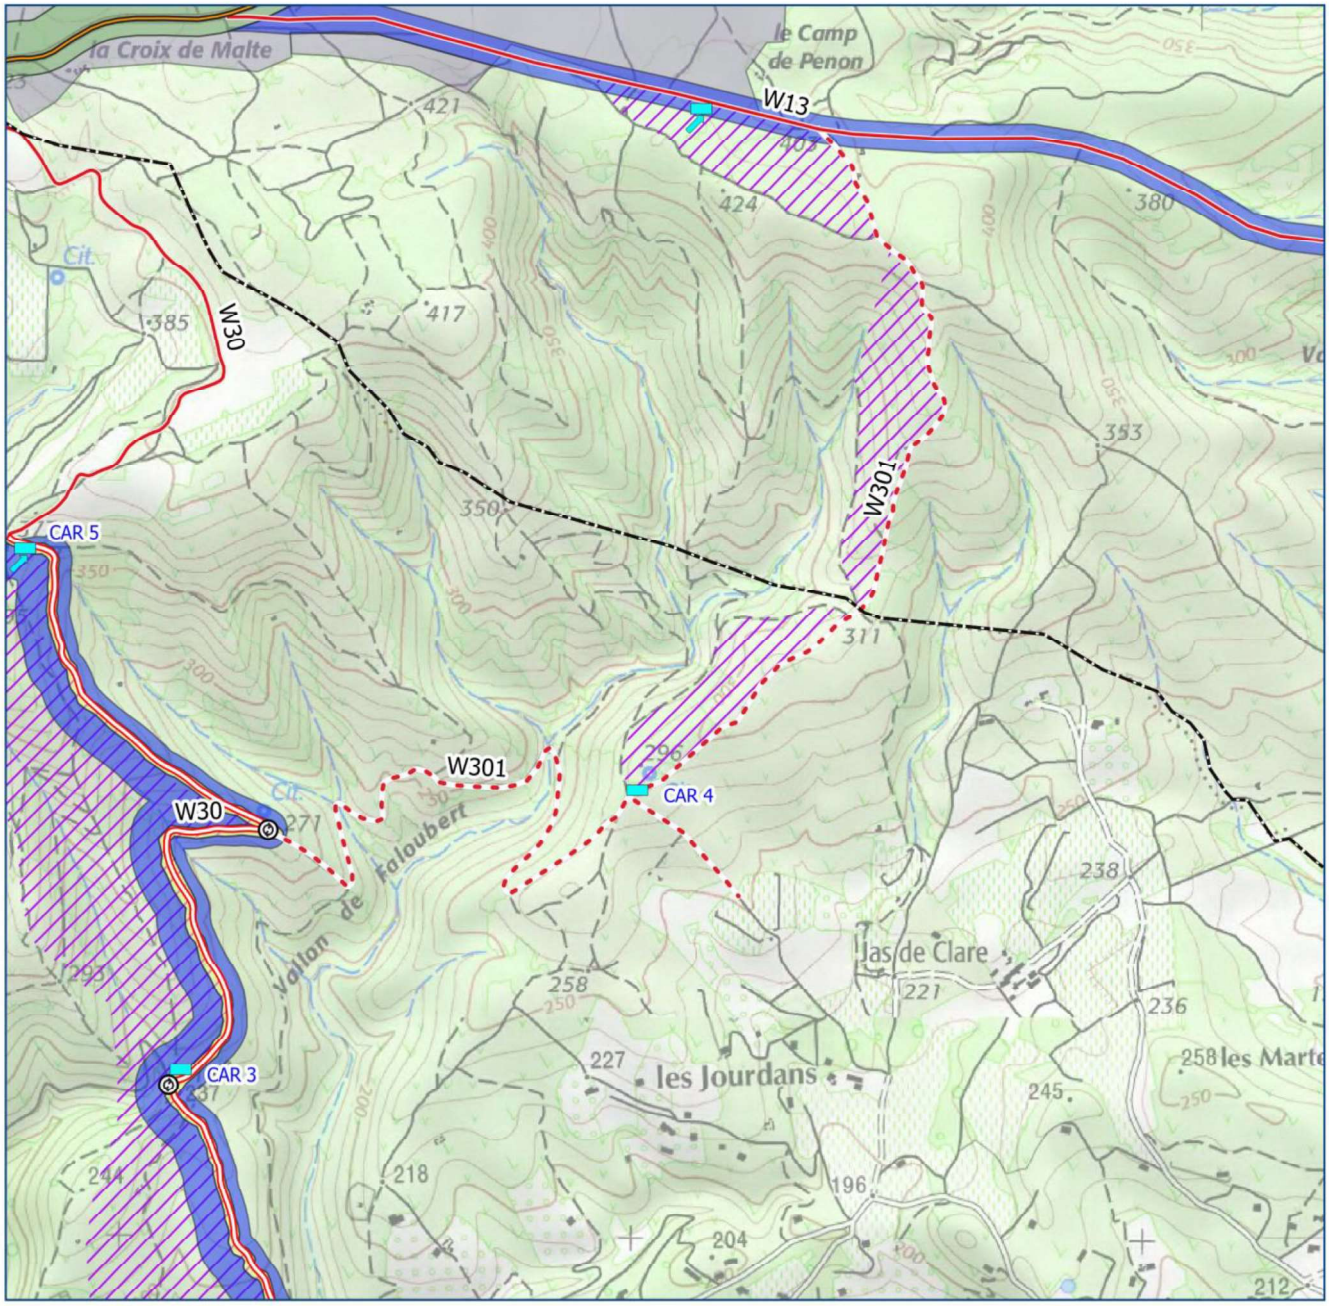

PIDAF de Sud Sainte Baume 2025 -2034

W301

- Communes

Linéaires DFCI
- 1ère Catégorie
- 2ème Catégorie
- Accès DFCI
- Piste de Liaison
- Route
- Portails "Intelligeants"

Places manoeuvre
- croisement
- Croisement

Débroussaillement
- Création
- Entretien
- Debroussaillement Département
- Priorité 1
- Priorité 2

Synergies
- Objectif d'éclaircie
- Brulage dirigé potentiel

Point d'eau
- Citerne à installer
- Citerne enterrée
- Citerne fixe
- Citerne à déplacer
- Prise sur canal
- Plan d'eau ou retenue
- Puisard
- Réserve incendie

Dessiné par :C. TRAMIER - Verifié par : GIOANNI
Référence fichier - Atlas_pour_fiches.qgz
Sources: © IGN – SCAN25 ®

N

0 300 600 m

La Provence, territoire d'excellence !
Sud Sainte Baume COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SCP

N° : 2023_01_12_83-ETU-ACTU-CASSB-PIDAF
